


प्रथम एलओपीओ के अनुसार निर्माणाधीन भवनो की भौतिक स्थिति

(बार चार्ट के अनुसार)

क्रम सं०	मेडिकल कालेज का नाम	दिनांक 15.08. 2018 तक का		दिनांक 31.08. 2018 तक का		दिनांक 15.09. 2018 तक का		दिनांक 30.09. 2018 तक का		दिनांक 15.10. 2018 तक का		दिनांक 31.10. 2018 तक का		समग्र भौतिक प्रगति दिनांक 31.08.2018 (प्रतिशत में)
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1 मेडिकल कालेज फिरोजाबाद														
	एकेडमिक, प्रशासनिक एवं लेक्चरर रूम (जी+3)	28		28	32	32	37	34	42	47	52	-	-	
	नर्सज हास्टल (जी+1)	65	65	65	75	75	83	80	90	95	100	-	-	
	ब्यायज हास्टल (जी+1)	65	65	65	75	75	83	80	90	95	100	-	-	
	गर्ल्स हास्टल (जी+1)	60	60	60	70	70	78	75	85	93	100	-	-	
	रेजीडेन्ट हास्टल (जी+1)	65	65	65	75	75	83	80	90	95	100	-	-	76
	श्रेणी-6 आवास (जी+1) 01 नं०	65	65	65	75	75	83	81	90	95	100	-	-	
	श्रेणी-5 के आवास (भूतल) 01 नं०	65	65	65	75	75	83	81	90	95	100	-	-	
	श्रेणी-4 के आवास (जी+2) 09 नं०	65	65	65	75	75	83	80	90	95	100	-	-	
	श्रेणी-3 के आवास (जी+2) 10 नं०	65	65	65	75	75	83	80	90	95	100	-	-	
	श्रेणी-2 के आवास (भूतल) 11 नं०	65	65	65	75	75	83	80	90	95	100	-	-	

निर्माणाधीन भवनो की भौतिक स्थिति (फिरोजाबाद)

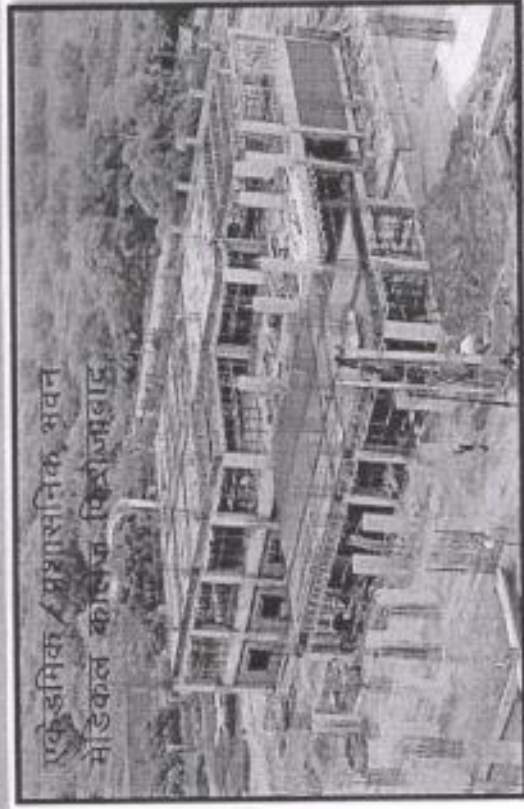


एकेडमिक / प्रशासनिक भवन दिनांक 10.08.2018
छात्र-छात्रावास,
मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद



दिनांक 15.09.2018



छात्र छात्रावास 10.08.2018

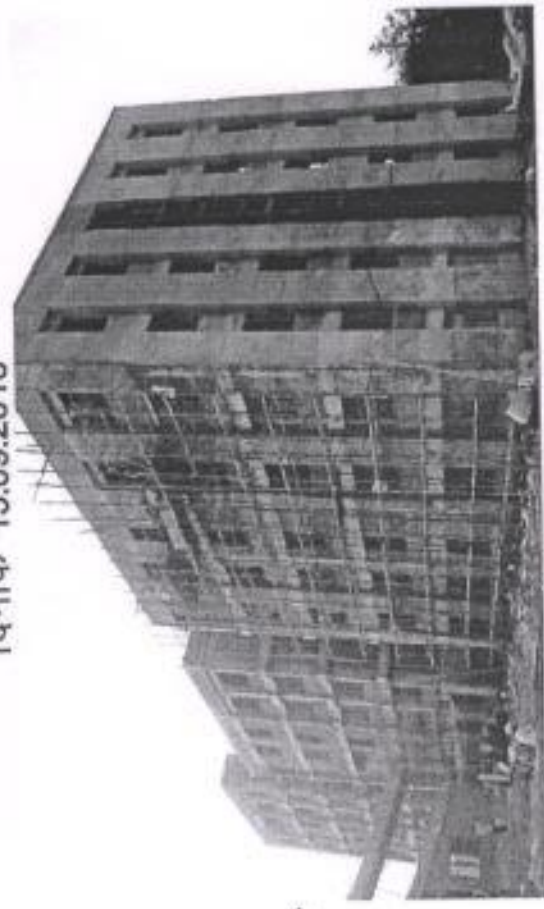

दिनांक 15.09.2018

निर्माणाधीन भवनो की भौतिक स्थिति (फिरोजाबाद)

प्रधानाचार्य आवास
मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद




प्रधानाचार्य आवास दिनांक 10.08.2018

श्रेणी-2 आवास (ब्लॉक-1)
मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद



श्रेणी-2 आवास दिनांक 10.08.2018

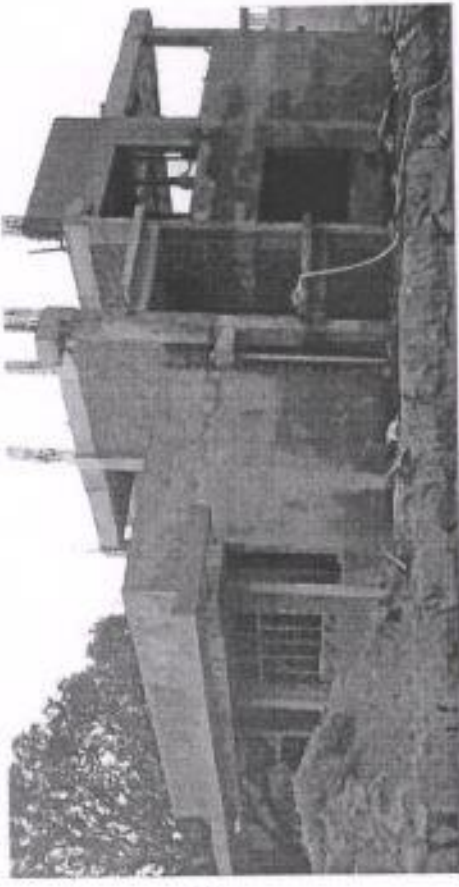

प्रधानाचार्य आवास दिनांक 15.09.2018



श्रेणी-2 आवास दिनांक 15.09.2018


निर्माणाधीन भवनो की भौतिक स्थिति (फिरोजाबाद)

श्रेणी-3 आवास,
मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद



श्रेणी-3 दिनांक 10.08.2018

श्रेणी-4 आवास,
मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद

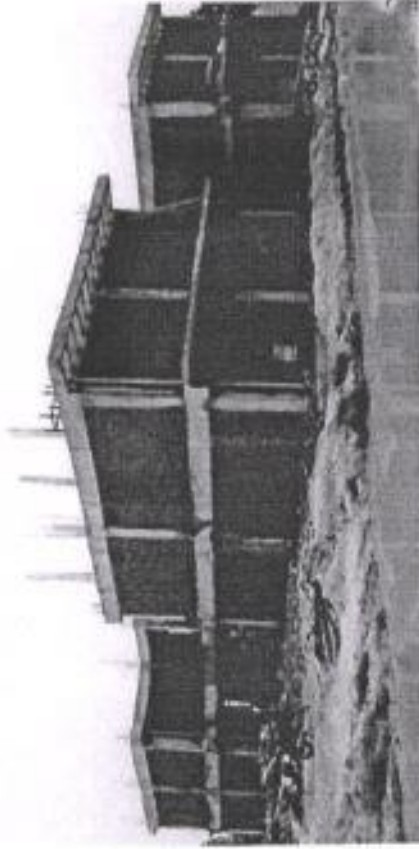

श्रेणी-4 दिनांक 10.08.2018




श्रेणी-3 दिनांक 15.09.2018




श्रेणी-4 दिनांक 15.09.2018

निर्माणाधीन भवनो की भौतिक स्थिति (फिरोजाबाद)

अवर जलाशय-2
मेडिकल कॉलेज

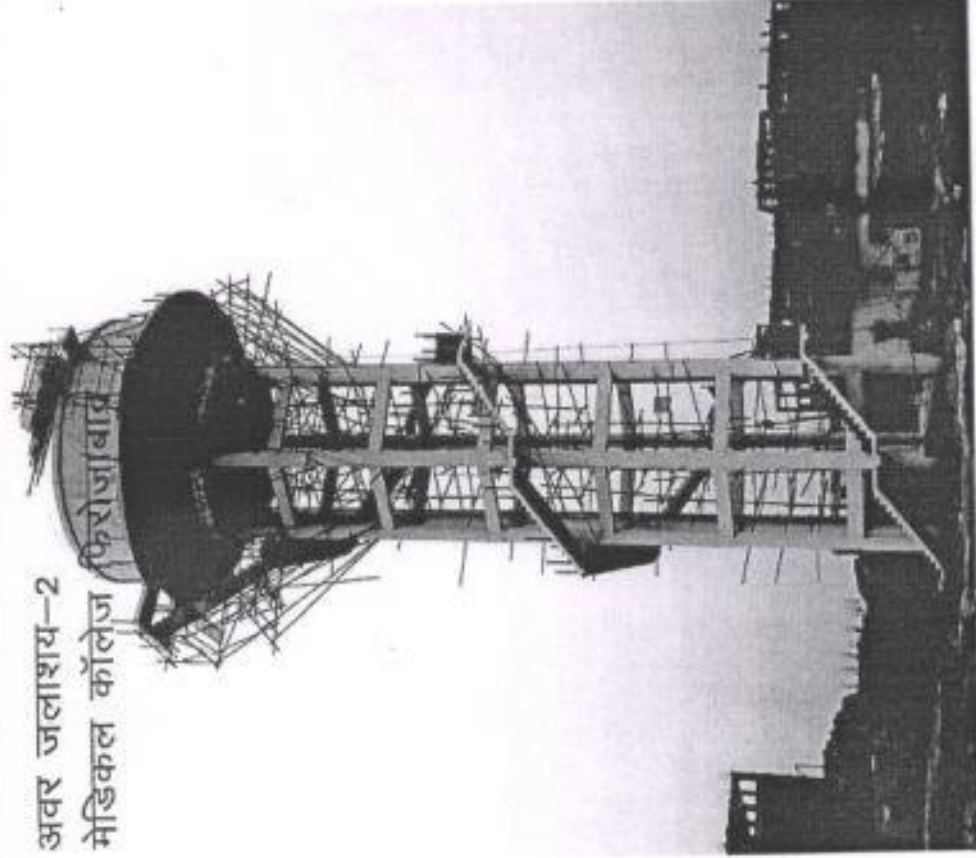

दिनांक 10.08.2018

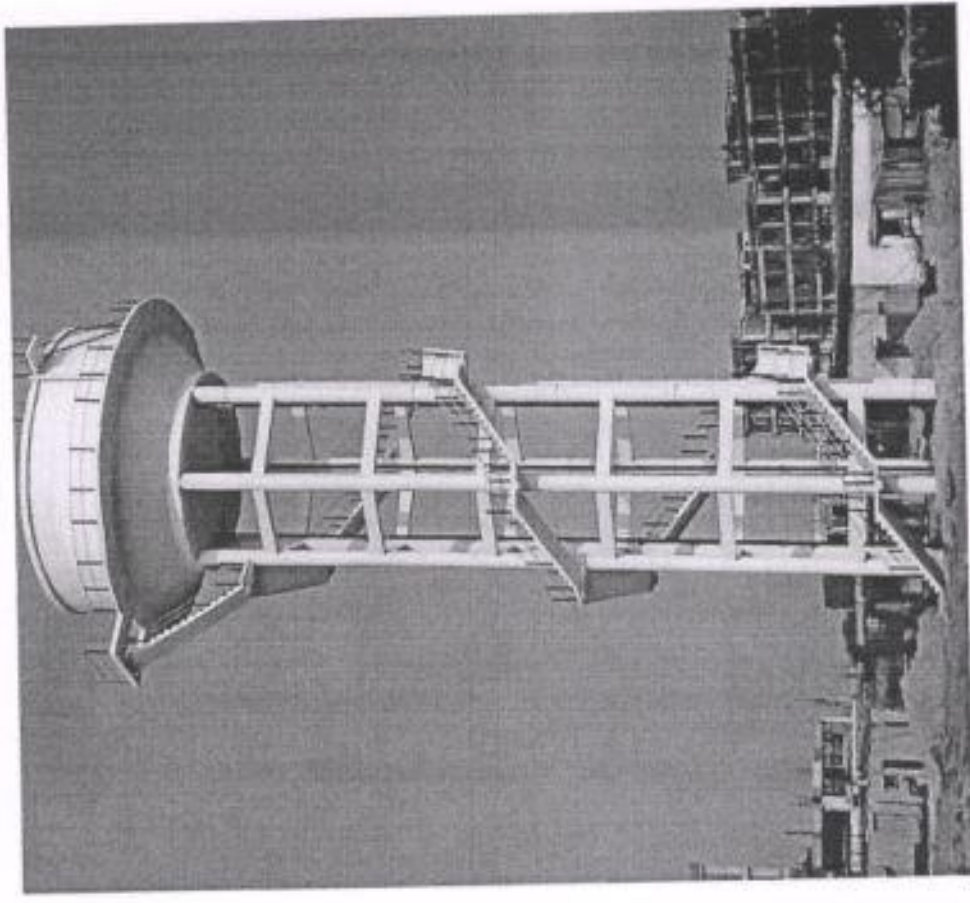

दिनांक 15.09.2018

राजकीय एलोपैथिक


मेडिकल कालेज

जनपद शाहजहाँपुर

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज जनपद शाहजहाँपुर

- कालेज शाहजहाँपुर जनपद के अजीजपुर गांव में निर्माणाधीन।
- कालेज परिसर ग्रामीण मार्ग पर स्थित।
- कालेज परिसर की बरेली कॉठ रोड से दूरी 1.5 किमी.।
- कालेज परिसर से जिला अस्पताल की दूरी : 08 किमी.।
- क्रियाशील जिला चिकित्सालय परिसर में 300 शैय्या अस्पताल में उपलब्ध एवं 100 शैय्या नव निर्मित एन0आर0एच0एम0 भवन में उपलब्ध है।
- उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल : 21.25 एकड़।
- मुख्य भवन 05 मंजिला।

निर्माणाधीन मेडिकल कालेज शाहजहाँपुर के प्रथम एलओपीओ हेतु प्रगति विवरण

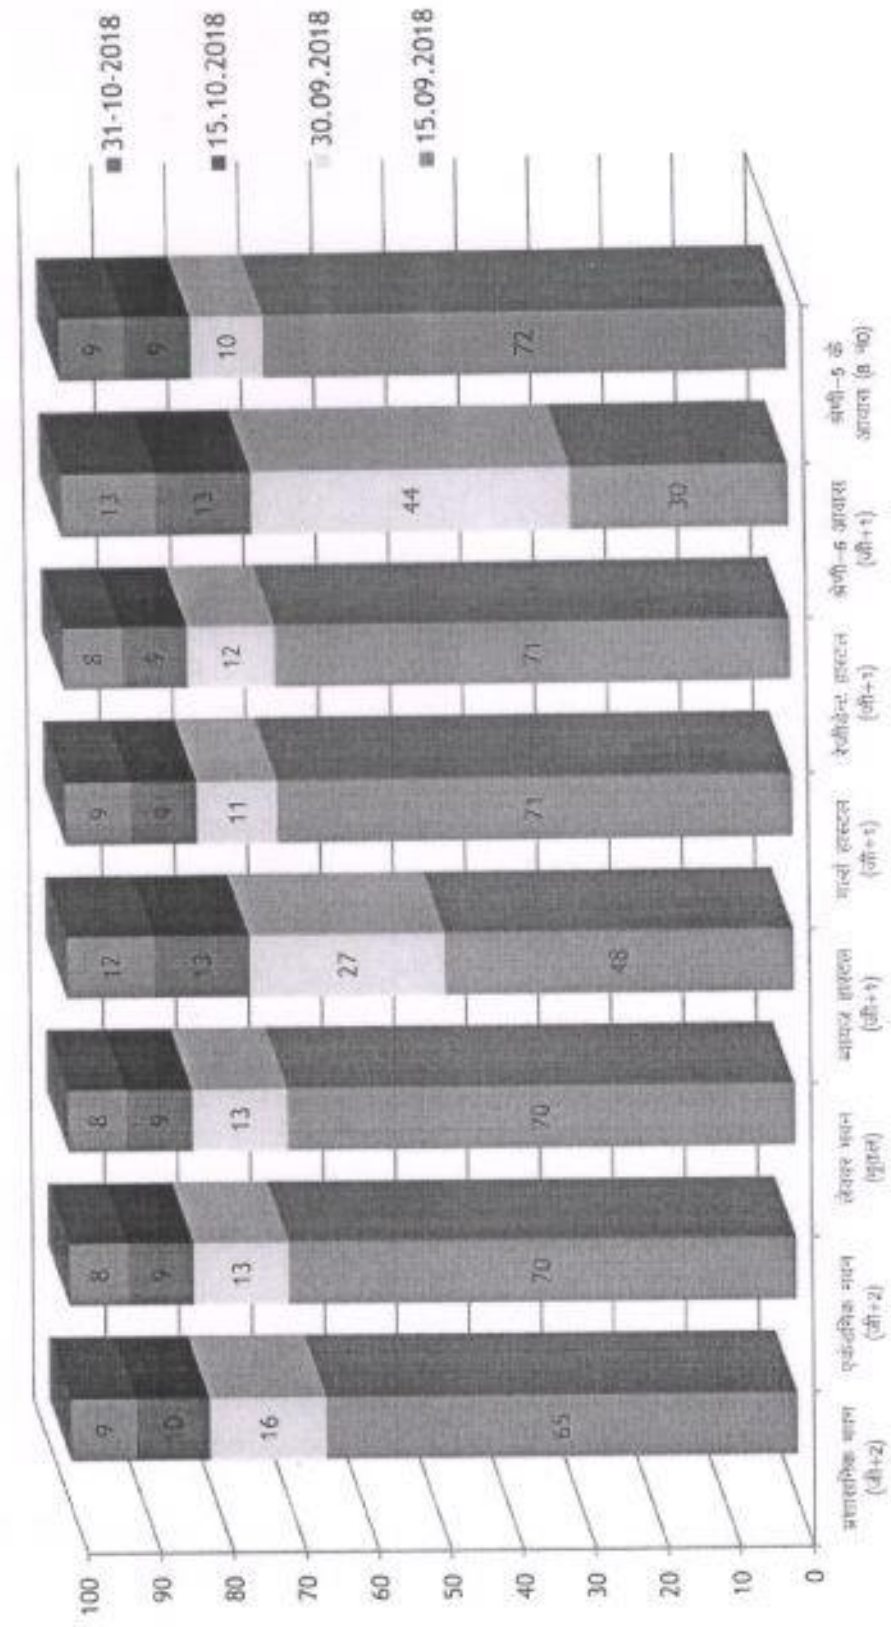


प्रगति विवरण का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण

प्रथम एलओपी0 के अनुसार निर्माणाधीन भवनो की भौतिक स्थिति


(बार चार्ट के अनुसार)

क्रम सं०	मेडिकल कालेज का नाम	दिनांक 15.08. 2018 तक का		दिनांक 31.08. 2018 तक का		दिनांक 15.09. 2018 तक का		दिनांक 30.09. 2018 तक का		दिनांक 15.10. 2018 तक का		दिनांक 31.10. 2018 तक का		समग्र भौतिक प्रगति दिनांक 31.08.2018 (प्रतिशत में)
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति (12.09. 2018)	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1	मेडिकल कालेज शाहजहाँपुर													
	•प्रशासनिक भवन (जी+2)	46	46	61	58	71	65	81	—	91	—	100	—	
	•एकेडमिक भवन (जी+2)	53	53	65	63	74	70	83	—	92	—	100	—	
	•लेक्चर हाल (भूतल)	54	54	66	64	75	70	83	—	92	—	100	—	
	•ब्यायज हास्टल (जी+1)	35	35	50	40	63	48	75	—	88	—	100	—	
	•गर्ल्स हास्टल (जी+1)	51	51	63	63	73	71	82	—	91	—	100	—	65
	•रेजीडेन्ट हास्टल (जी+1)	50	50	65	62	74	71	83	—	92	—	100	—	
	•श्रेणी-6 आवास (जी+1)	24	24	44	29	59	30	74	—	87	—	100	—	
	•श्रेणी-5 के आवास (08 नं०)	52	52	64	64	73	72	82	—	91	—	100	—	


निर्माणाधीन भवनो की भौतिक स्थिति (शाहजहाँपुर)

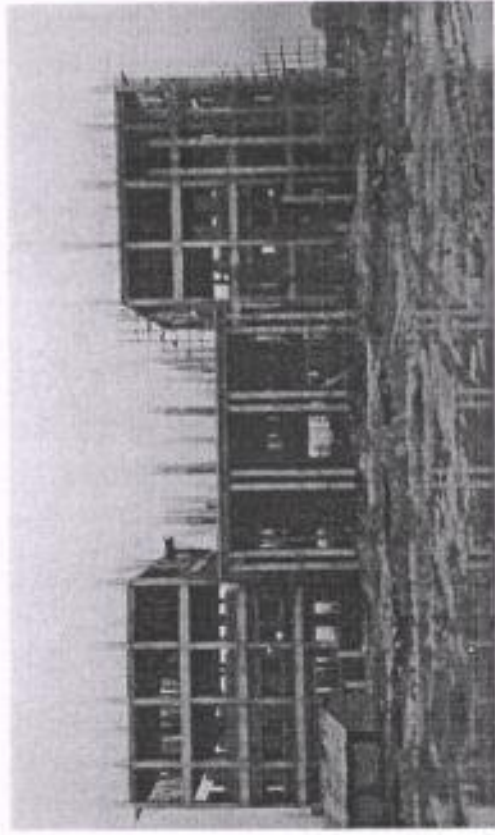

एकेडमिक भवन दिनांक 10.08.2018

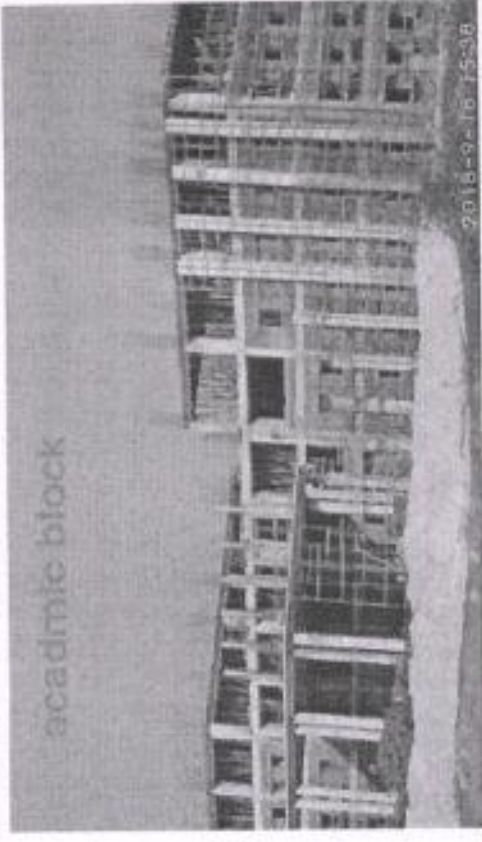

एकेडमिक भवन दिनांक 15.09.2018

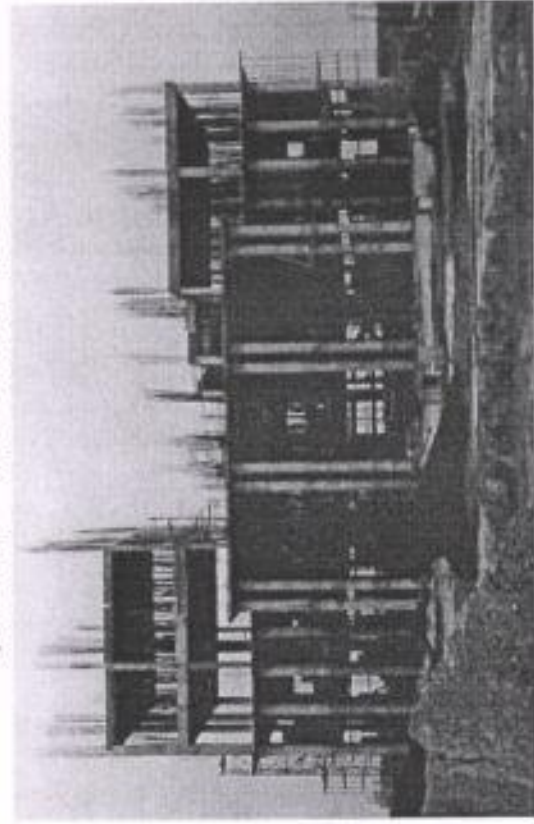


प्रशासनिक दिनांक 30.04.2018



प्रशासनिक दिनांक 15.09.2018




निर्माणाधीन भवनो की भौतिक स्थिति (शाहजहाँपुर)

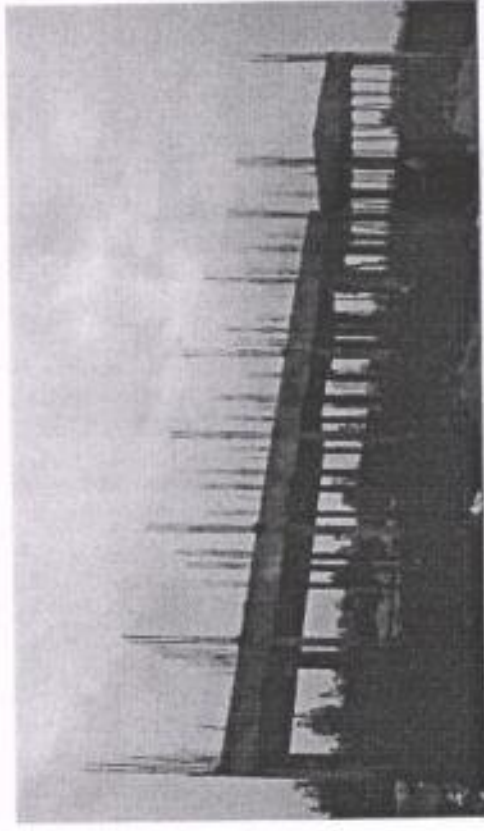


ब्यायज हास्टल दिनांक 10.08.2018



ब्यायज हास्टल दिनांक 15.09.2018

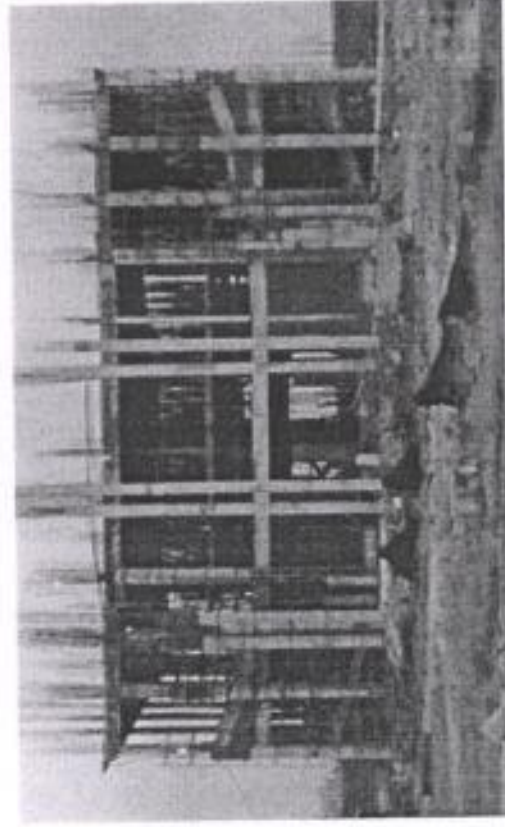

लेक्कर हाल दिनांक 10.08.2018

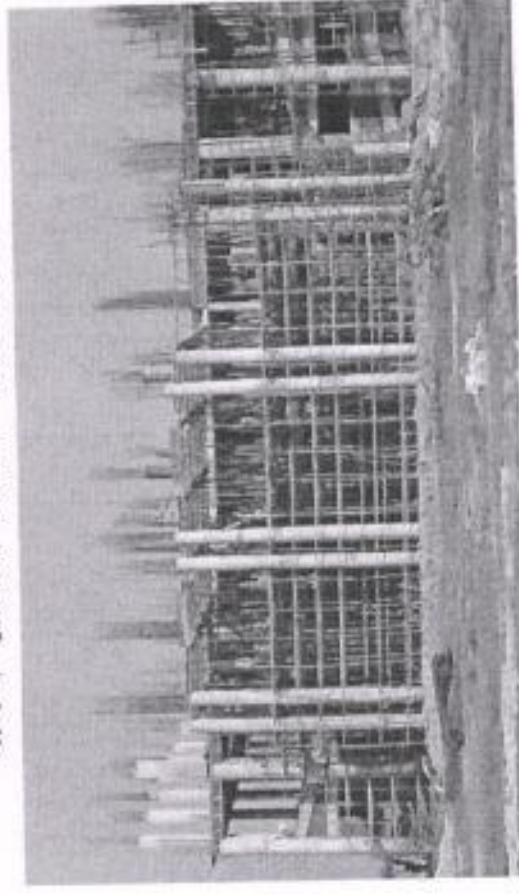

लेक्कर हाल दिनांक 15.09.2018
